

道の駅「(仮称) やまがた蔵王」整備事業 工事だより

vol. **02**
2023.01 月発行

pickup 今月のイチオシ

着々と。基礎工事を進めています。



昨年中は近隣の皆さまには大変お世話になりました。現在、インフルエンザ及びコロナウイルスが猛威を奮っておりますが、感染対策を図り工事を進めて参ります。2月中旬にはいよいよ鉄骨の建方を開始予定です。無事故・無災害で安全作業で頑張ります。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

工事概要


C 工区



型枠：梁の型枠の組立完了しました。

A ▶ B ▶ C

本工事では A・B・C 工区に分けて工事中。1 番南側の A 工区から順々に基礎工事が進められています。

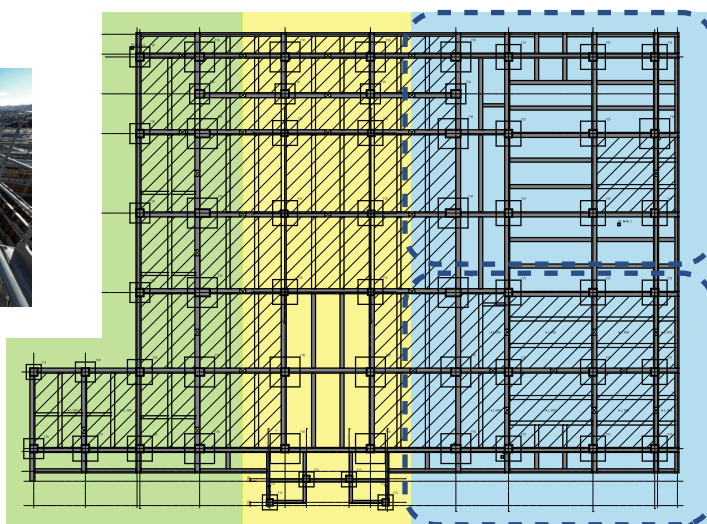


B 工区

コンクリート：型枠にコンクリートを流し込み、固まったら型枠を外します。

A 工区



型枠：掘削した地盤に土を入れ、床（スラブ）の断熱型枠材の組立を行いました。

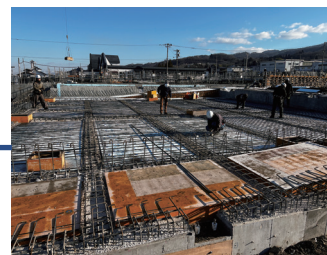

鉄筋：コンクリートを頑丈にするための骨組みを組み立てています。
